Identificación del Pozo	9/30/2013	10/31/2013	11/30/2013	12/31/2013	1/31/2014	2/7/2014
B07-055-HG	29.06	29.09	28.98	28.06	27.65	27.41
TSF-03-GT	3.23	3.13	3.13	3.01	3.08	3.08
TSF-10-GT						11.17
TSF-1003-GT	1.16	1.07	1.06	0.93	1.03	1.06
VG07-096-HG	6.20	6.48	6.68	5.46	5.74	5.87

Identificación	Coordenadas-Northing	Coordenadas-Easting	Stickup (m)	Profundidad Total del Pozo (m)
B07-055-HG	**977,202**	**537,853**	0.981	26.47
TSF-03-GT	**983,258**	**536,369**	0.750	15.3
TSF-10-GT	**981,340**	**539,035**	0.947	28.1
TSF-1003-GT	**982,930**	**536,590**	0.495	4.5
VG07-096-HG	**975,863**	**534,202**	1.152	32.5

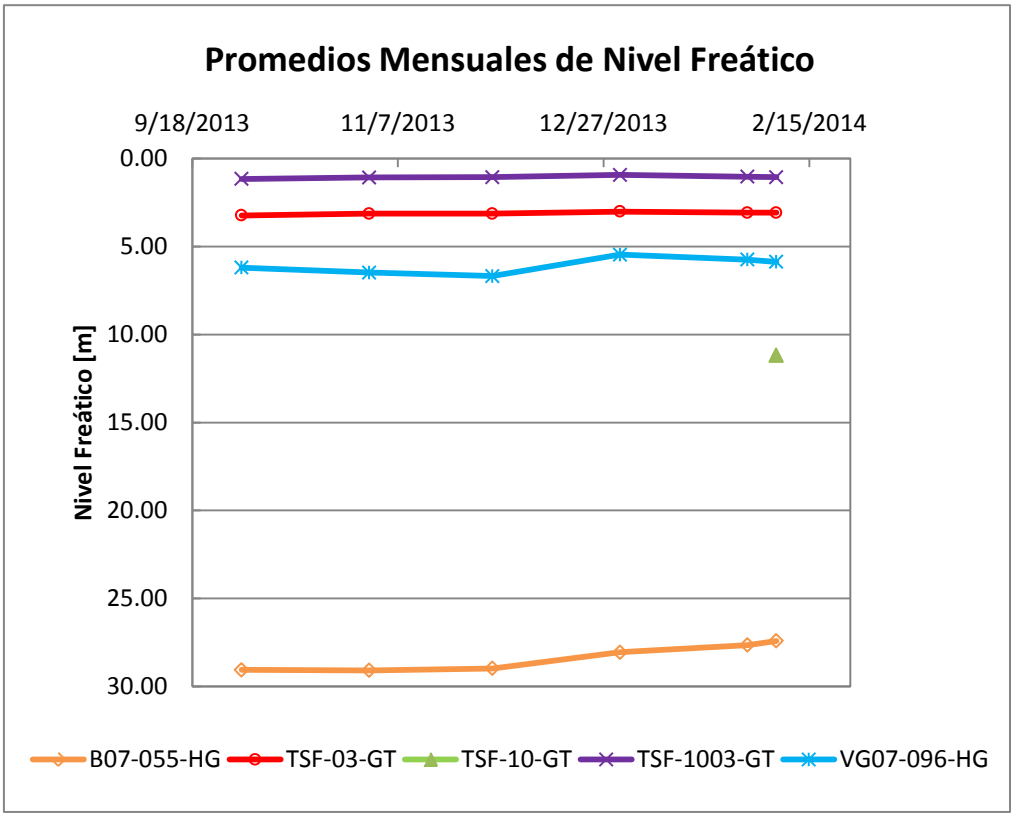
Promedios Mensuales de Nivel Freático
9/18/2013
11/7/2013
12/27/2013
2/15/2014
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Nivel Freático [m]
B07-055-HG
TSF-03-GT
TSF-10-GT
TSF-1003-GT
VG07-096-HG
